TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES (HORS INTEMPERIES)
COMMUNE DE MEZT-EN-COUTURE
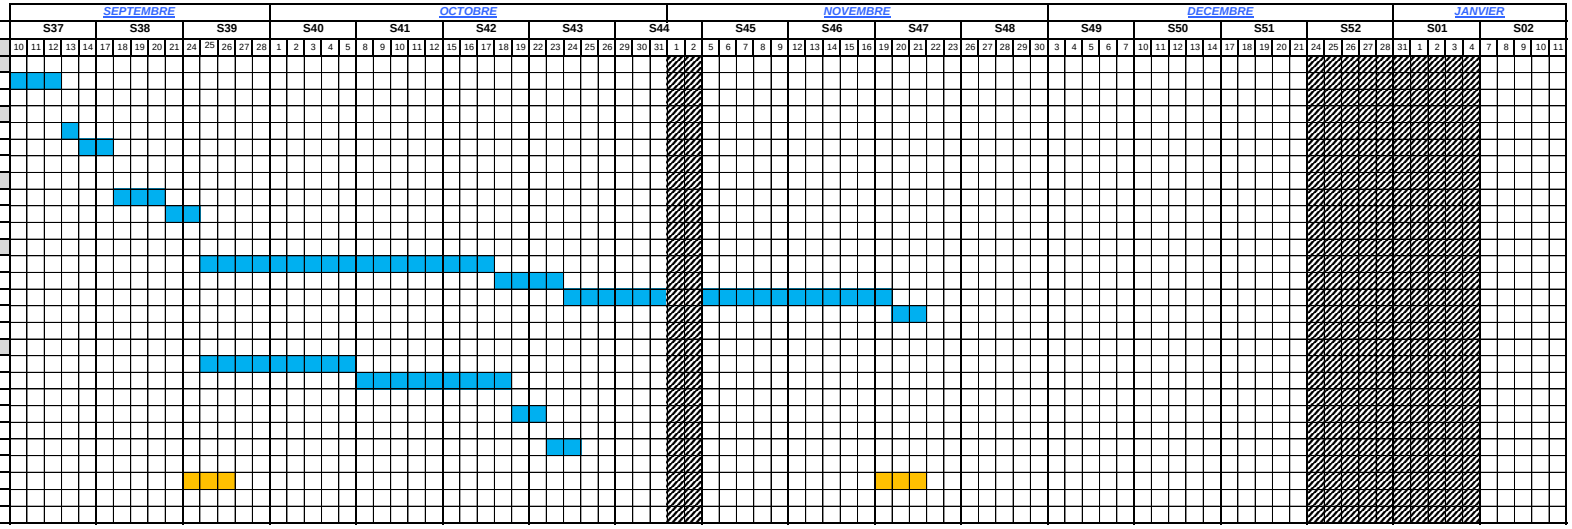
Désignation des travaux	Quantitées	Nb Jours
INSTALLATION DE CHANTIER		
Base vie, Signalisation, sondage et rabotage		3J
RUE PLACE DE LA MAIRIE		
Pose réseau AEP fonte DN100	75ML	1J
Branchement AEP	5U	2J
RUE DU MARCHE		
Pose réseau AEP fonte DN100	160ML	3J
Branchement AEP	6U	2J
RUE DE PERONNE		
Pose réseau AEP fonte DN125	507ML	17J
Pose réseau AEP fonte DN80	243ML	4J
Branchement AEP	50U	17J
Branchement AEP Stade		2j
RUE ELBOISE		
Pose réseau AEP fonte DN150 + BY PASS et clapet	400ML	9J
Branchement AEP	26U	9J
POSE POTEAUX INCENDIE DN101	4U	2J
ESSAIS ET REPLIS		2J
REFECTION CHAUSSE ET TROTTOIR (SS-TRAITANT)
